Team-Plan v0.2

Project: FundAnalyst

Αλλαγές σε σχέση με το ν0.1

- Έχει γίνει μετονομασία του έργου απο «FineBuget» σε «FundAnalyst»
- Έχουν αυξηθεί τα τυπικά υποέργα και έχουν γίνει πιο λεπτομερή τα διαγράμματα.

Μέλη ομάδας:

Άγγελος Δήμογλης, ΑΜ: 1059603 Έτος :4°

Δημήτρης Τσούνης, ΑΜ:1059698 Έτος :4°

Καλλιόπη Δρούγα, ΑΜ:1039159 Έτος : Επί διπλώματι

Ρόλοι μελών για το παρόν κείμενο

Editor(s): Καλλιόπη Δρούγα

Peer reviewer: Άγγελος Δήμογλης

Χρονοπρογραμμάτισμός του Project FundAnalyst:

Το Project έχει χωριστέι σε 13 τυπικά υποέργα, με βάση τα παραδοτέα και η κανονική εκτίμηση (σε ημέρες) έχουν ορισθεί με βάση τις ημερομηνίες παράδοσης του κάθε παραδοτέου.

ΤΥ1: Δημιουργία Ομάδας

TY2: Project Description

TY3: Team plan

TY4: Project plan

TY5: Risk Assessment

TY6: Use Cases

TY7: Domain Model

TY8: Class Diagram

TY9: Robustness-diagrams

TY10: Project-code

TY11: Sequence-diagrams


TY12: Test Cases

TY13: Ολοκλήρωση Project

Ημερομηνία έναρξης: 1/3/2021

ТҮПІКО ҮПОЕРГО	ПРОАПАІТОУМЕНО	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ (σε μέρες)	ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ (σε μερες)	ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ (σε μέρες)				
TY1	-	5	8	3				
TY2	TY1	17	18	15				
TY3	TY2	17	18	15				
TY4	TY2	17	18	15				
TY5	TY2	17	18	15				
TY6	TY2	34	38	28				
TY7	TY2,TY6	51	52	47				
TY8	TY6,TY7	69	72	62				
TY9	TY6	18	19	15				
TY10	TY6,TY8	53	57	50				
TY11	TY9	17	18	14				
TY12	TY10	17	19	15				
TY12	TY10,TY12	7	9	4				

PERT ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ PROJECT:

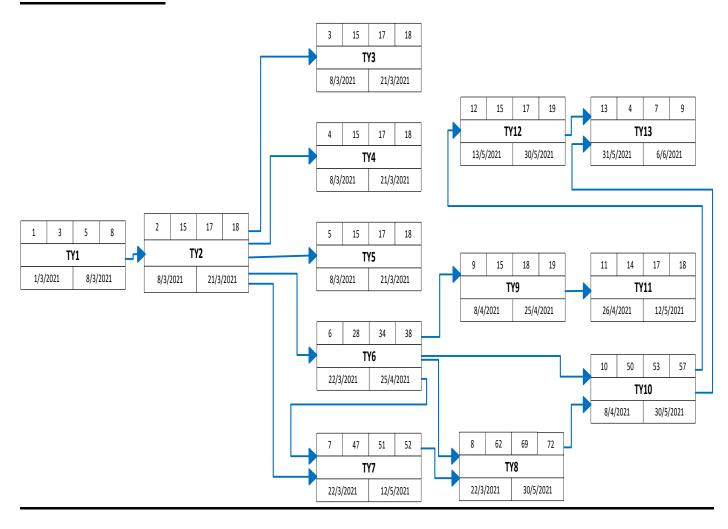

GANT ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ PROJECT

		Start	Finish	Duration	Μαρ 2021				Απρ 2021				Μαϊ 2021				louv 2021				
ID	Task Name				28/2	7/3	14/3	21/3	28/3	4/4	11/4	18/4	25/4	2/5	9/5	16/5	23/5	30/5	6/6	13/6	20/6
1	ΤΥ1: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ	1/3/2021	10/3/2021	1,43w																	
2	TY2:PROJECT DESCRIPTION	8/3/2021	21/3/2021																		
3	TY3:TEAM PLAN	8/3/2021	21/3/2021																		
4	TY4:PROJECT PLAN	8/3/2021	21/3/2021																		
5	TY5:RISK ASSESSMENT	8/3/2021	28/3/2021																		
6	TY6:USE CASES	22/3/2021	25/4/2021																		
7	TY7:DOMAIN MODEL	22/3/2021	12/5/2021	7,43w																	
8	TY8:CLASS DIAGRAM	22/3/2021	30/5/2021																		
9	TY9:ROBUSTNESS DIAGRAMS	8/4/2021	25/4/2021	2,57w																	
10	TY10:PROJECT CODE	8/4/2021	30/5/2021	7,57w																	
11	TY11:SEQUENCE DIAGRAMS	26/4/2021	12/5/2021	2,43w																	
12	TY12:TEST CASES	13/5/2021	30/5/2021	2,57w																	
13	ΤΥ13:ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ PROJECT	31/5/2021	6/6/2021																		

Μέθοδος Εργασίας:

Η μέθοδος με την οποία αποφασίσαμε να δουλέψουμε έιναι η μέθοδος **SCRUM**. Το SCRUM είναι μια επαναληπτική και ευέλικτη μέθοδος για τη διαχείρηση της ανάπτυξης ενός προιόντος λογισμικού. Επιτρέπει στην ομάδα ανάπτυξης να λειτουργεί ως μονάδα για την επίτευξη του στόχου και να αυτοοργανώνετε τόσο με φυσική όσο και με διαδικτυακή συνεργάσια όλων των μέλων της ομάδας, γι' αυτό και επιλέχθηκε. Οι συναστήσεις της όμαδας έχουν καθορίστει να γίνονται δύο φορές κάθε εβδόμαδα ώστε να ενημερώνται όλα τα μέλη της όμαδας, ο Scrum Master και ο Product Owner για την πορεία του project.

Οι ρόλοι των μελών της ομάδας μας είναι:

Product Owner: Άγγελος Δημόγλης

Scrum Master: Δημήτρης τσούνης

Team: Δρούγα Καλλιόπη , Άγγελος Δημόγλης , Δημήτρης Τσούνης

(Όλα τα μέλη τις ομάδας θα δουλέψουν στην ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και έλεγχο του λογισμικού).

Βασικά Εργάλεια

Τα βασικά εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε είναι:

- το Visual Studio Code ως πρόγραμμα επεξεργασίας πηγαίου κώδικα
- Το **Word** για την συγγραφή ρων αναφορών
- Η **Python** σαν αντικειμενοστραφής γλώσσα.

•

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν

Το Pert και Gant διάγραμμα δημιουργήθηκε με το εργαλείο Microsoft Visio Pro 2013.

Αναφορές

"Σκραμ." In *Βικιπαίδεια*, January 5, 2021. https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BC&oldid=8613223
