Project-plan-v1.0

FundAnalyst

Αλλαγές στην νέα έκδοση Project-plan-v1.0:

1) Έγιναν αλλαγές σε όλα τα διαγράμματα και πίνακες με πολλά περισσότερα task για τον καθένα γιατί έγινε καλύτερη ανάλυση του κάθε task σε σχεδιασμό και ανάπτυξη. Οπότε δημιουργήθηκαν νέα διαγράμματα κατανομής προσωπικού, Gantt chart, Pert chart. Επίσης άλλαξαν και οι αναθέσεις χρόνου και οι εκτιμήσεις κόστους για κάθε task.

Μέλη Ομάδας:

Όνομα:	Αριθμός	Έτος:
	Μητρώου:	
Άγγελος Δήμογλης	1059603	50
Δημήτρης Τσούνης	1059698	50
Νικόλαος Κοντογιώργης	1070922	40
Καλλιόπη Δρούγα	1039159	Επί διπλώματι

Ρόλοι μελών για το παρόν κείμενο:

Editor(s): Νικόλαος Κοντογιώργης

Peer reviewer: Άγγελος Δήμογλης

Ανάθεση Έργου:

Στο Project Plan ορίζουμε σαν Deadline για την υλοποίηση κάθε εργασίας από 1^η Μαρτίου μέχρι 10 Ιουνίου (τελική παράδοση 12 Ιουνίου) ώστε να έχουμε περιθώριο δύο ημερών για τυχόν λάθη στην εκτίμηση χρόνου.

Οι εργασίες που έχουν ανατεθεί σε κάθε μέλος είναι:

Αγγελος: Μενού Σχεδιασμός, Μενού Ανάπτυξη, Επισκόπηση πωλήσεων Σχεδιασμός, Επισκόπηση πωλήσεων Ανάπτυξη, Δημιουργία Αναφοράς Σχεδιασμός, Δημιουργία Αναφοράς Ανάπτυξη

Νίκος: Διαχείριση Χρηστών Σχεδιασμός, Διαχείριση Χρηστών Ανάπτυξη, Τιμολόγια Σχεδιασμός, Τιμολόγια Ανάπτυξη, Φορολόγηση Σχεδιασμός, Φορολόγηση Ανάπτυξη

Δημήτρης: Επισκόπηση εξόδων Σχεδιασμός, Επισκόπηση εξόδων Ανάπτυξη, Διαθέσιμο υπόλοιπο Σχεδιασμός, Διαθέσιμο υπόλοιπο Ανάπτυξη, Μηνιαίος Προϋπολογισμός Σχεδιασμός, Μηνιαίος Προϋπολογισμός Ανάπτυξη

Κέλλυ: Πιστοποίηση Σχεδιασμός, Πιστοποίηση Ανάπτυξη, Επισκόπηση εξόδων Ανάπτυξη, Υποστήριξη Σχεδιασμός, Υποστήριξη Ανάπτυξη

Δεν υπάρχουν ξεχωριστές εργασίες για Δοκιμές. Έχουμε ορίσει πως στο τέλος κάθε task γίνονται και οι απαραίτητες δοκιμές ώστε να μην δημιουργηθούν επιπλέον λάθη και στα επόμενα task.


Αναλυτικός χρόνος για κάθε εργασία:

- Μενού Σχεδιασμός (Task 3): 7 ημέρες
- Μενού Ανάπτυξη (Task 4): 12 ημέρες
- Επισκόπηση εξόδων Σχεδιασμός (Task 6): 7 ημέρες
- Επισκόπηση εξόδων Ανάπτυξη (Task 12): 20 ημέρες
- Μηνιαίος Προϋπολογισμός Σχεδιασμός (Task 17): 7 ημέρες
- Μηνιαίος Προϋπολογισμός Ανάπτυξη (Task 20): 23 ημέρες
- Πιστοποίηση Σχεδιασμός (Task 1): 3 ημέρες
- Πιστοποίηση Ανάπτυξη (Task 2): 12 ημέρες
- Διαθέσιμο υπόλοιπο Σχεδιασμός (Task 8): 8 ημέρες
- Διαθέσιμο υπόλοιπο Ανάπτυξη (Task 14): 24 ημέρες

- Επισκόπηση πωλήσεων Σχεδιασμός (Task 5): 8 ημέρες
- Επισκόπηση πωλήσεων Ανάπτυξη (Task 11): 24 ημέρες
- Φορολόγηση Σχεδιασμός (Task 18): 7 ημέρες
- Φορολόγηση Ανάπτυξη (Task 21): 25 ημέρες
- Υποστήριξη Σχεδιασμός (Task 9): 7 ημέρες
- Υποστήριξη Ανάπτυξη (Task 15): 20 ημέρες
- Τιμολόγια Σχεδιασμός (Task 10): 8 ημέρες
- Τιμολόγια Ανάπτυξη (Task 16): 24 ημέρες
- Διαχείριση Χρηστών Σχεδιασμός (Task 7): 7 ημέρες
- Διαχείριση Χρηστών Ανάπτυξη (Task 13): 20 ημέρες
- Δημιουργία Αναφοράς Ανάπτυξη (Task 19): 7 ημέρες
- Δημιουργία Αναφοράς Σχεδιασμός (Task 22): 25 ημέρες

Το αναλυτικό πρόγραμμα φαίνεται πιο καθαρά στο διάγραμμα κατανομής προσωπικού (εικόνα 1) και στο Gantt chart (εικόνα 2):


Εικόνα 1: Διάγραμμα κατανομής προσωπικού

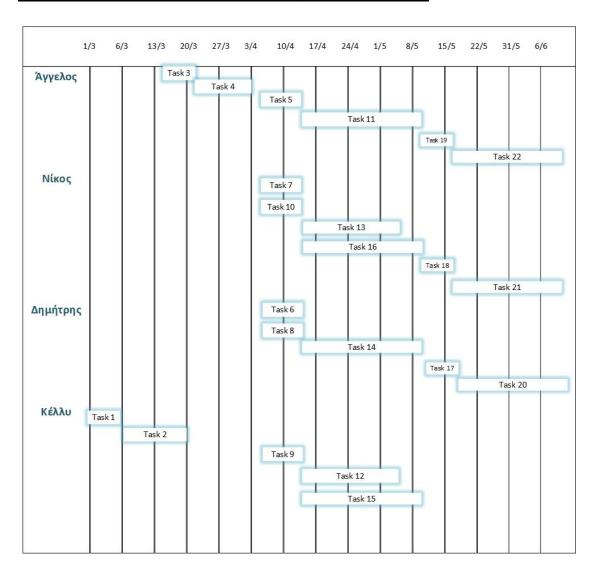

Εικόνα 2: Gantt Chart



Εικόνα 3: Pert Chart

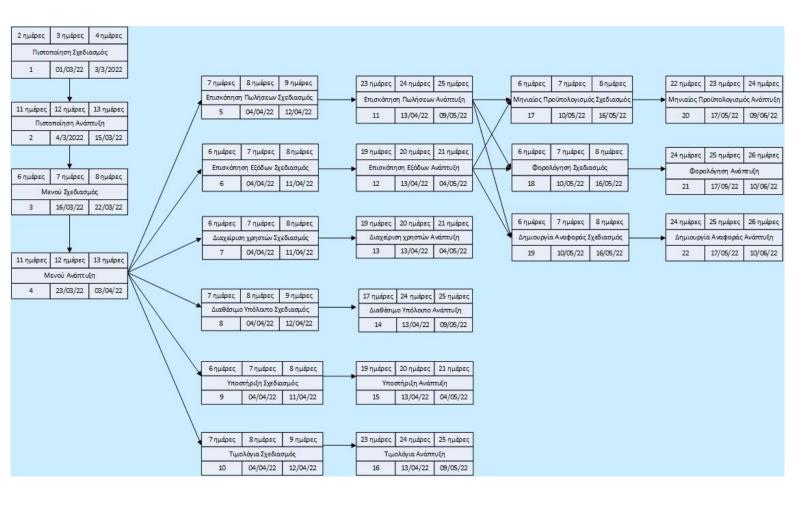

Στο Pert Chart (εικόνα 3) Φαίνεται αναλυτικά η αισιόδοξη, η κανονική και η απαισιόδοξη εκτίμηση διάρκειας κάθε εργασίας αλλά και οι ημερομηνίες που ξεκινάει και θα τελειώνει κάθε task. Η τελική ημερομηνία είναι 10/06/22.

Εκτίμηση Κόστους

Κάθε μέλος της ομάδας θα αμείβεται με το ίδιο ποσό ανά ώρα (15 ευρώ/ώρα) γιατί ο καθένας θα συνεισφέρει το ίδιο για την ετοιμασία του Project. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται αναλυτικά ο χρόνος που θα δαπανηθεί για την κάθε εργασία και το συνολικό κόστος κάθε εργασίας.

Εργασία	<u>Χρόνος</u>	<u>Κόστος(15ευρώ/</u> <u>ώρα)</u>
Μενού Σχεδιασμός	56 ώρες	840 ευρώ
Μενού Ανάπτυξη	96 ώρες	1.440 ευρώ
Επισκόπηση εξόδων Σχεδιασμός	168 ώρες	2.520 ευρώ
Επισκόπηση εξόδων Ανάπτυξη	160 ώρες	2.400 ευρώ
Μηνιαίος Προϋπολογισμός Σχεδιασμός	56 ώρες	840 ευρώ
Μηνιαίος Προϋπολογισμός Ανάπτυξη	184 ώρες	2.760 ευρώ
Πιστοποίηση Σχεδιασμός	24 ώρες	360 ευρώ

Πιστοποίηση Ανάπτυξη	96 ώρες	1.440 ευρώ
Διαθέσιμο υπόλοιπο Σχεδιασμός	64 ώρες	960 ευρώ
Διαθέσιμο υπόλοιπο Ανάπτυξη	192 ώρες	2.880 ευρώ
Φορολόγηση Σχεδιασμός	56 ώρες	840 ευρώ
Φορολόγηση Ανάπτυξη	200 ώρες	3.000 ευρώ
Υποστήριξη Σχεδιασμός	56 ώρες	840 ευρώ
Υποστήριξη Ανάπτυξη	160 ώρες	2.400 ευρώ
Τιμολόγια Σχεδιασμός	64 ώρες	960 ευρώ
Τιμολόγια Ανάπτυξη	192 ώρες	2.880 ευρώ
Διαχείριση Χρηστών Σχεδιασμός	56 ώρες	840 ευρώ
Διαχείριση Χρηστών Ανάπτυξη	160 ώρες	2.400 ευρώ
Επισκόπηση πωλήσεων Σχεδιασμός	64 ώρες	960 ευρώ

Επισκόπηση πωλήσεων Ανάπτυξη	192 ώρες	3.360 ευρώ
Δημιουργία Αναφοράς Ανάπτυξη	56 ώρες	840 ευρώ
Δημιουργία Αναφοράς Σχεδιασμός	200 ώρες	3.000 ευρώ
		Σύνολο: 36.960 ευρώ

Τα διάγραμμα κατανομής προσωπικού (εικόνα 1), Gantt chart (εικόνα 2) και Pert chart (εικόνα 3) δημιουργήθηκαν με το εργαλείο Microsoft Visio.
