Project-plan-v0.1

FundAnalyst

Μέλη Ομάδας:

| Όνομα: | Αριθμός | Έτος: |
|--------------------------|----------|---------------|
| | Μητρώου: | |
| Άγγελος Δήμογλης | 1059603 | 50 |
| Δημήτρης Τσούνης | 1059698 | 50 |
| Νικόλαος Κοντογιώργης | 1070922 | 40 |
| Καλλιόπη Δρούγα | 1039159 | Επί διπλώματι |

Ρόλοι μελών για το παρόν κείμενο:

Editor(s): Νικόλαος Κοντογιώργης ,Δημήτρης Τσούνης,

Peer reviewer: Άγγελος Δήμογλης

Ανάθεση Έργου:

Στο Project Plan ορίζουμε σαν Deadline για την υλοποίηση κάθε εργασίας από 1^η Μαρτίου μέχρι τέλη Μάιου (12 εβδομάδες), έπειτα ο υπόλοιπος χρόνος που θα ανατεθεί θα είναι για τις απαραίτητες τελειοποιήσεις του Project.

Οι εργασίες που έχουν ανατεθεί είναι 9 και διαμοιραστεί στον κάθε εργαζόμενο ανάλογα με το πρόγραμμά του για την καλύτερη διαχείριση του project.

Οι εργασίες που έχουν ανατεθεί σε κάθε μέλος είναι:

Άγγελος: Πιστοποίηση, Επισκόπηση πωλήσεων, εξαγωγή αναφορών, Μενού

Νίκος: Διαθέσιμο υπόλοιπο, εξαγωγή αναφορών, πολλαπλοί χρήστες

Δημήτρης: Μηνιαίος Προϋπολογισμός, εξαγωγή αναφορών, διαθέσιμο υπόλοιπο

Κέλλυ: Επισκόπηση εξόδων


Επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, όλα τα μέλη ξεκινάνε την πρώτη εβδομάδα με μία εργασία ο καθένας για να έχουμε την καλύτερη διαχείρηση χρόνου.

Αναλυτικός χρόνος για κάθε εργασία:

- Μενού: 1η-3η εβδομάδα
- πολλαπλοί χρήστες: 1η-3η εβδομάδα
- Επισκόπηση εξόδων: 1η-2η εβδομάδα
- Μηνιαίος Προϋπολογισμός: 1η-2η εβδομάδα
- Πιστοποίηση: 2η-4η εβδομάδα
- Διαθέσιμο υπόλοιπο: 3η-6η εβδομάδα
- Επισκόπηση πωλήσεων: 5η-8η εβδομάδα
- Εξαγωγή αναφορών: 5η-11η εβδομάδα
- Δοκιμές: 11η-12η εβδομάδα


Το αναλυτικό πρόγραμμα φαίνεται πιο καθαρά στο Gantt διάγραμμα (εικόνα 1):

Εικόνα 1: Gantt Chart

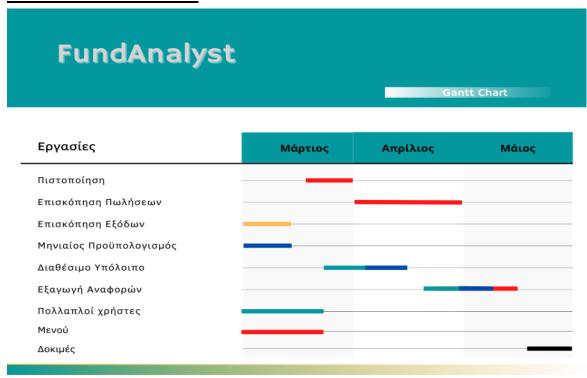

Άγγελος Νίκος Δημήτρης Κέλλυ Όλοι

Εικόνα 2: Pert Chart

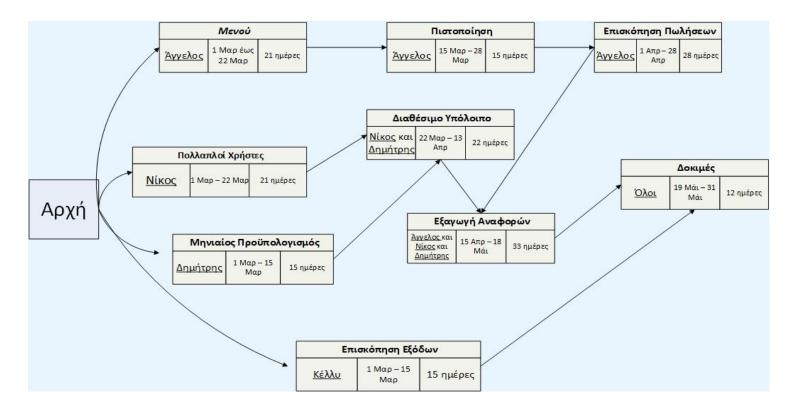

Στο Pert Chart (εικόνα 2) φαίνεται αναλυτικά τις εργασίες που θα κάνει το κάθε μέλος της ομάδας, πόσο χρόνο θα αφιερώσει για την κάθε εργασία και πως θα κινηθεί.

Εκτίμηση Κόστους

Κάθε μέλος της ομάδας θα αμείβεται με το ίδιο ποσό ανά ώρα (15 ευρώ/ώρα) γιατί ο καθένας θα συνεισφέρει το ίδιο για την ετοιμασία του Project. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται αναλυτικά ο χρόνος που θα δαπανηθεί για την κάθε εργασία και το συνολικό κόστος κάθε εργασίας (τονίζουμε πάλι ότι ο υπολογισμός του χρόνου είναι μέχρι τις 31 Απριλίου που είναι το deadline για τις παραπάνω εργασίες και έπειτα θα συνεχίσουμε με τις τελειοποιήσεις του Project).

| <u>Εργασία</u> | <u>Χρόνος</u> | <u>Κόστος(15ευρώ/</u> <u>ώρα)</u> |
|----------------------------|---------------|--------------------------------------|
| Μενού | 126 ώρες | 1890 ευρώ |
| Πιστοποίηση | 90 ώρες | 1350 ευρώ |
| Επισκόπηση πωλήσεων | 168 ώρες | 2520 ευρώ |
| Πολλαπλοί χρήστες | 126 ώρες | 1890 ευρώ |
| Μηνιαίος Προϋπολογισμός | 90 ώρες | 1350 ευρω |
| Διαθέσιμο υπόλοιπο | 132 ώρες | 1980 ευρώ |

| Επισκόπηση εξόδων | 90 ώρες | 1350 ευρώ |
|----------------------|----------|-----------|
| Εξαγωγή αναφορών | 198 ώρες | 2970 ευρώ |
| Δοκιμές | 72 ώρες | 1080 ευρώ |

Το Gantt chart και το Pert chart δημιουργήθηκαν με το εργαλείο Microsoft Visio.
