

Project: FundAnalyst

PROJECT PLAN

Μέλη ομάδας:
Άγγελος Δήμογλης, AM: 1059603 Έτος :4ο
Δημήτρης Τσούνης, AM:1059698 Έτος :4ο
Καλλιόπη Δρούγα, AM:1039159 Έτος : Επί διπλώματι

Ρόλοι μελών για το παρόν κείμενο

Editor(s): Δημήτρης Τσούνης
Peer reviewer: Άγγελος Δήμογλης

Στην έκδοση 0.2 του παρόντος τεχνικού κειμένου διορθώθηκαν κάποιες παραλήψεις που υπήρχαν στην έκδοση 0.1 .

Συγκεκριμένα, προστέθηκε η κατανομή προσωπικού και επαναυπολογίστηκε το συνολικό κόστος της ανάπτυξης της εφαρμογής.Επίσης το προϊόν μετονομάστηκε σε FundAnalyst.


Η ανάθεση έργου έγινε ως εξής:

		1/3	8/3	15/3	22/3	29/3	5/4	12/4	19/4	26/4	3/5	10/5	17/5	24/5	31/5
A		TY1 25%				TY3 50%				TY5 25%				TY7 33,3%	
		TY2 25%				TY4 50%				TY6 25%					
K		TY1 50%				TY3 25%				TY5 25%				TY7 33,3%	
		TY2 50%				TY4 25%				TY6 25%					
Δ		TY1 25%				TY3 25%				TY5 50%				TY7 33,3%	
		TY2 25%				TY4 25%				TY6 50%					

			Μαρτιος				Απρίλιος				Μαίος			
Εβδομάδα	Αρχή	Τέλος	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ΤΥ1:Πιστοποίηση	1/4	14/4												
ΤΥ2:Μενού	15/3	21/4												
ΤΥ3:Επισκόπηση	21/3	30/4												
ΤΥ4:Προυπο/μος	1/4	7/5												
ΤΥ5:Υπόλοιπο	1/5	21/5												
ΤΥ6:GUI	7/4	21/5												
ΤΥ7:Δοκιμές	21/5	30/5												

Κέλλυ
Αγγελος
Δημήτρης
Ολοι

PERT Chart

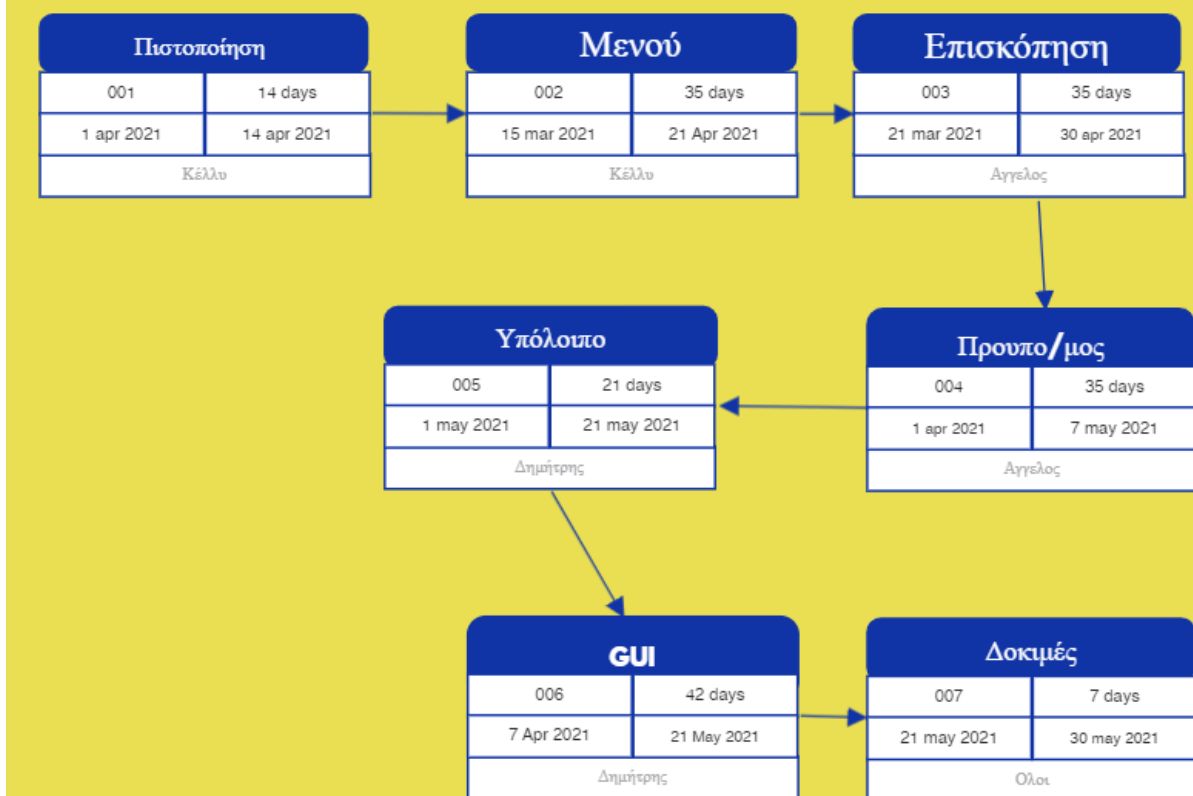

Χαρακτηριστικό	Περιγραφή	Χρόνος	Κόστος(15€/ωρα)
Πιστοποίηση	Login με κωδικό πρόσβασης	75 ωρες	1125 ευρώ
Μενού	Πλοήγηση στην εφαρμογή	150 ωρες	2250 ευρώ
Επισκόπηση	Επισκόπηση πωλήσεων-εξόδων	150 ωρες	2250 ευρώ
Προυπο/μος	Υπολογισμός κέρδους	220 ωρες	3300 ευρώ
Υπόλοιπο	Επισκόπηση κεφαλαίων	100 ωρες	1500 ευρώ
GUI	Γραφικό περιβάλλον	200 ωρες	3000 ευρώ
Δοκιμές	Δοκιμές των παραπάνω χαρακτηριστικών	40 ώρες	600 ευρώ

Συνολικά 14025 ευρώ.

Η ανάθεση του έργου έγινε με ms vizio
To gantt έγινε με ms word
To pert έγινε με το εργαλείο visme
